

L564 OD Loffenau

Bauabschnitt 5.2

Regierungspräsidium Karlsruhe Baureferat 47.2, Informationsveranstaltung Loffenau, 26.01.2021

Ltd BD Jürgen Genthner, Referatsleiter Baureferat Mitte

Dennis Saldern, Bauleiter



Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE

Allgemeines

- letzter Abschnitt der Gesamtausbaumaßnahme OD Loffenau
- Gemeinschaftsmaßnahme zwischen Land und Gemeinde
- Baubeginn: 15. Februar 2021
- vsl. Bauende: Ende Februar 2022
- Baukosten i.H.v. ca. 1,9 Mio Euro, davon
 - rund 0,7 Mio € Land
 - rund 1,2 Mio € Gemeinde



Umfang der Arbeiten

- Land
 - Ausbau der OD auf ca. 310 m Länge
 - Anpassung der Straßentwässerung
 - Fahrbahndeckenerneuerung Untere Dorfstraße
 - Rückbau der stillgelegten Kaltenbrunnenbachverdolung
- Gemeinde
 - Bau eines beidseitigen Gehwegs
 - Erneuerung aller Abwasserleitungen, inkl. Aufdimensionierung der Hauptleitung
 - Erneuerung der Haupt- und Anschlusswasserleitungen
 - Verlegung von Leerrohren für Glasfaserausbau



2021

Februar

April

Juni


August

Oktober

Dezember

Februar

2022

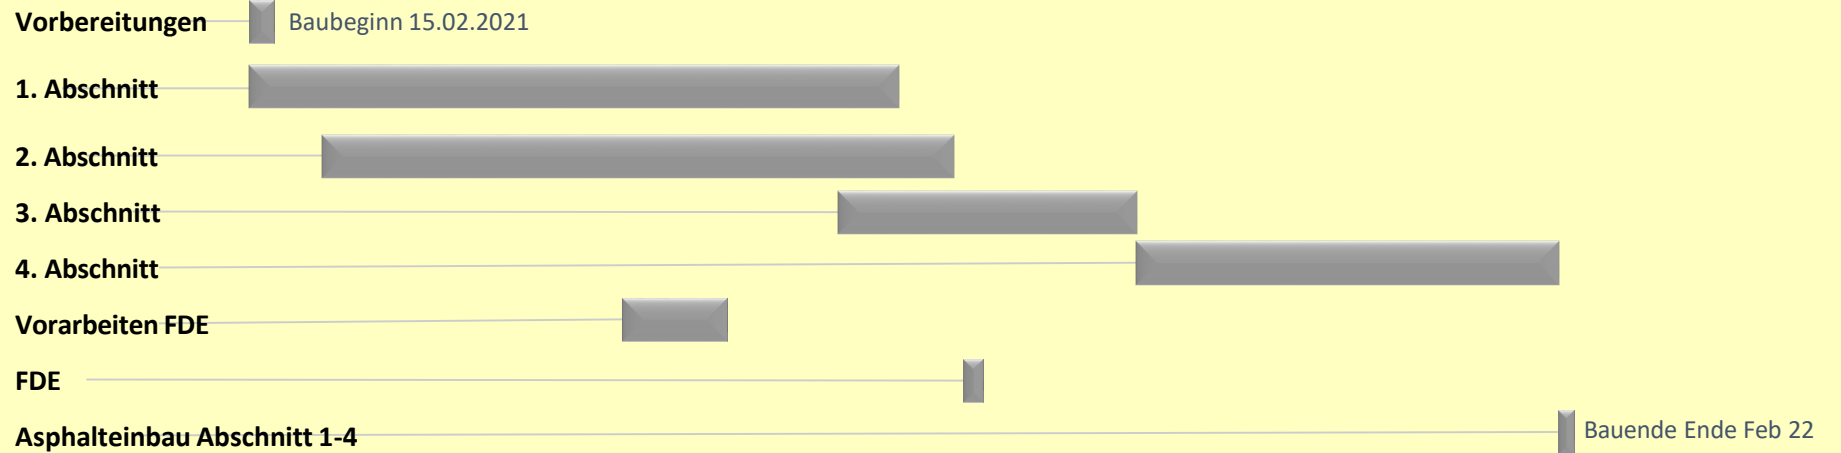


2021 Februar April Juni August Oktober Dezember Februar 2022

Vorbereitungen Baubeginn 15.02.2021

1. Abschnitt Feb, 21 - Aug, 21

2. Abschnitt März, 21 - Sep, 21

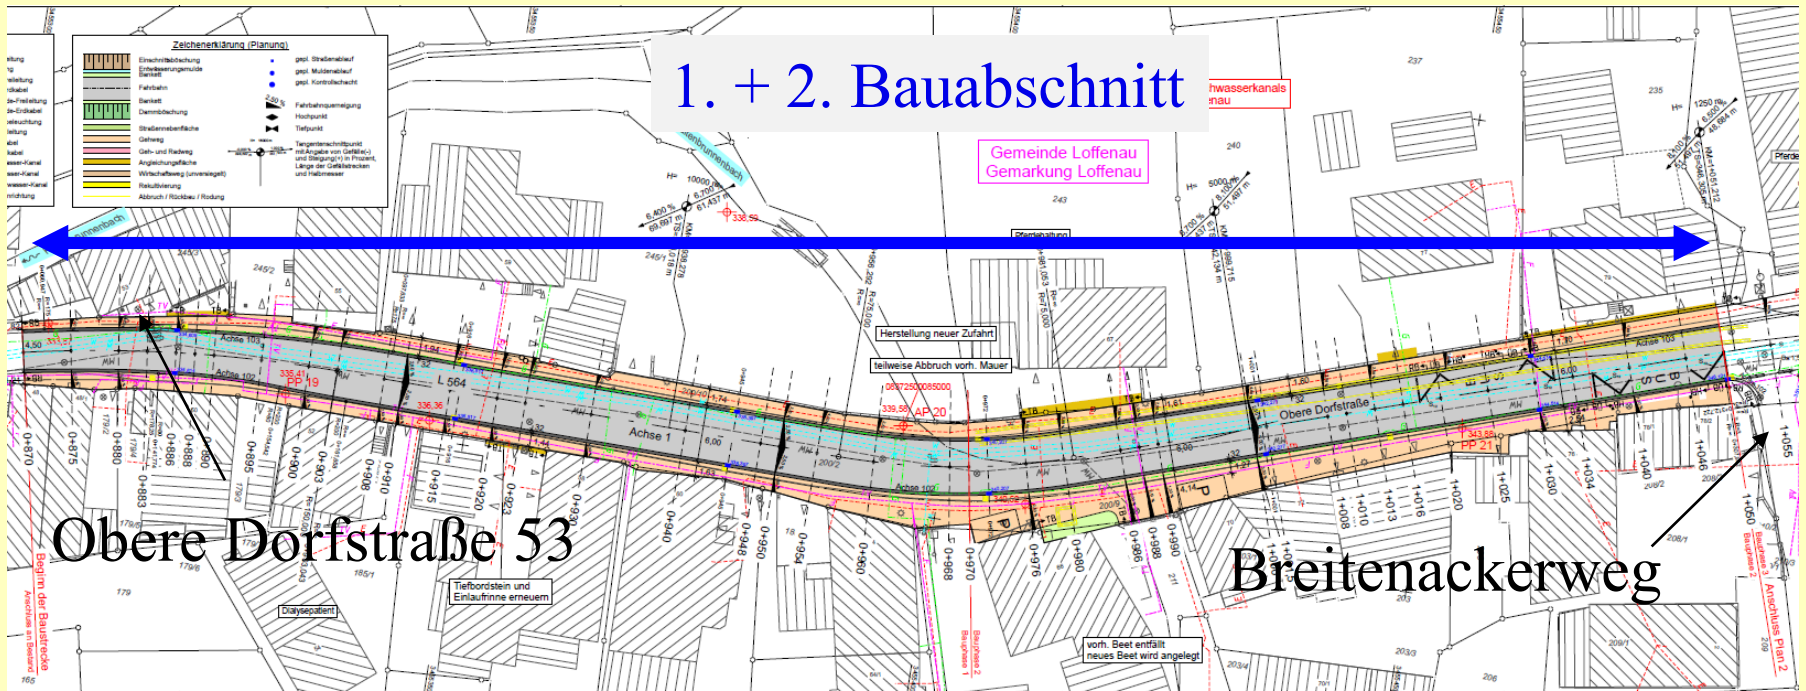

1. + 2. Bauabschnitt

Obere Dorfstraße 53

Breitenackerweg



Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE

2021

Februar

April

Juni

August

Oktober

Dezember

Februar

2022

Vorbereitungen

Baubeginn 15.02.2021

1. Abschnitt


Feb, 21 - Aug, 21

2. Abschnitt

März, 21 - Sep, 21

L 564 / Obere Dorfstraße

Achse 1

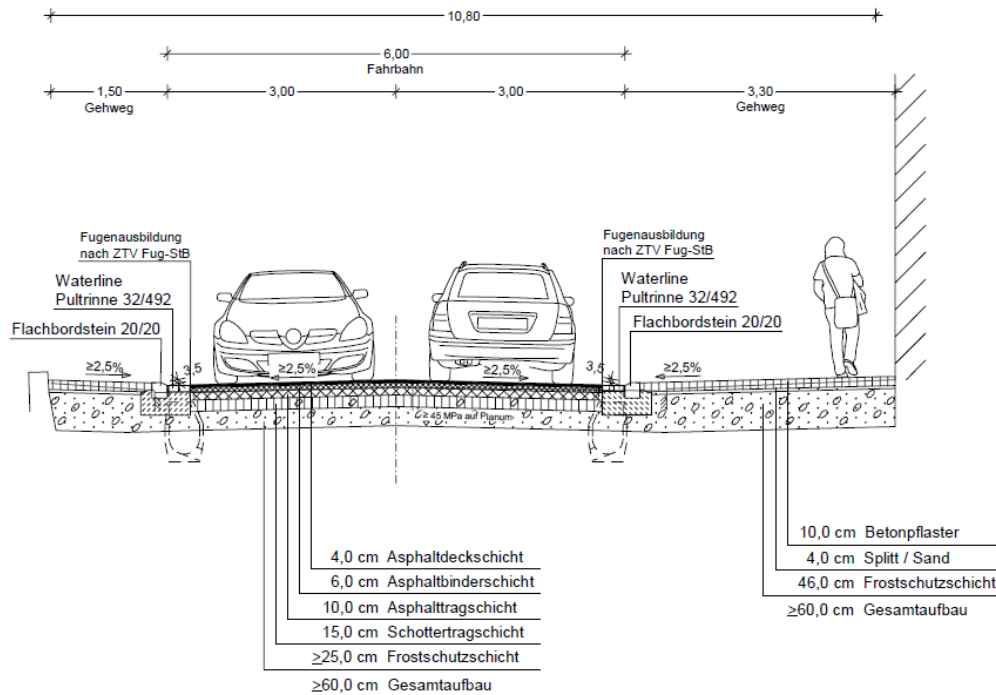

2021

Februar

April

Juni

August

Oktober

Dezember

Februar

2022

Vorbereitungen


Baubeginn 15.02.2021

1. Abschnitt

Feb, 21 - Aug, 21

2. Abschnitt

März, 21 - Sep, 21

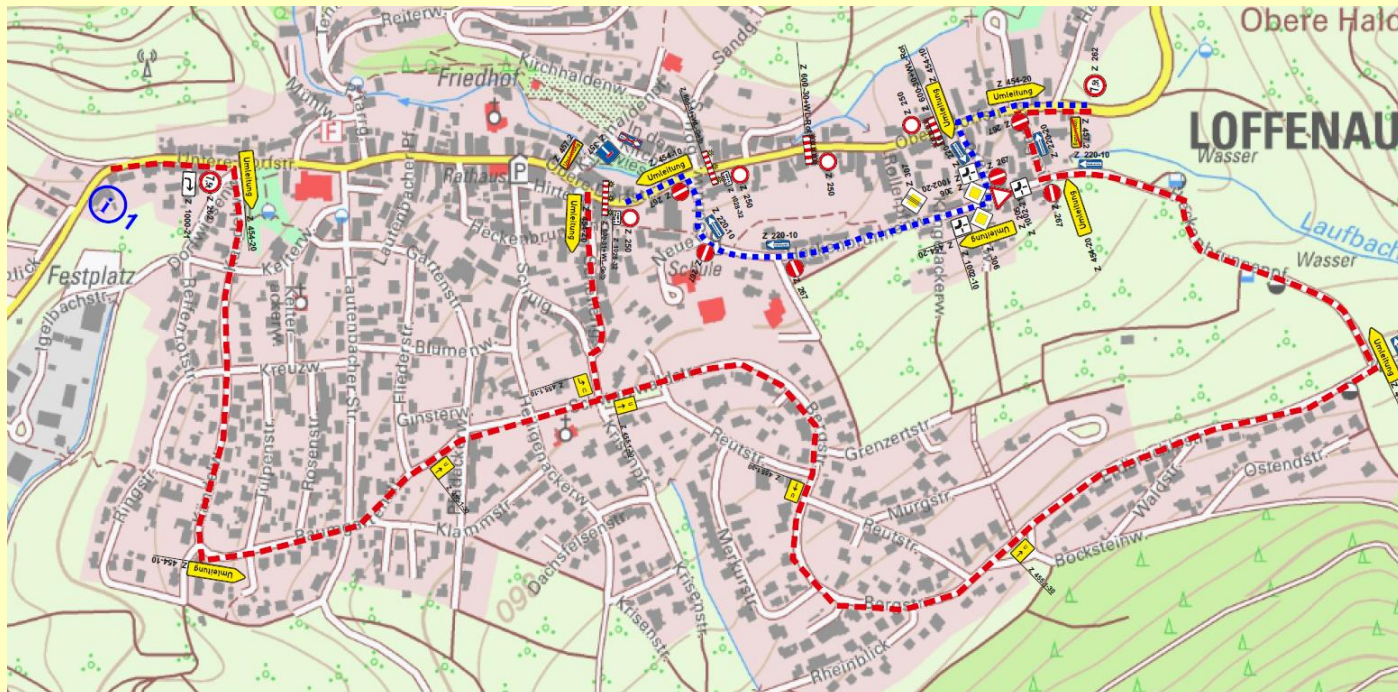

Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE

2021

Februar

April

Juni

August

Oktober

Dezember


Februar

2022

3. Abschnitt

Aug, 21 - Nov, 21

3. Bauabschnitt

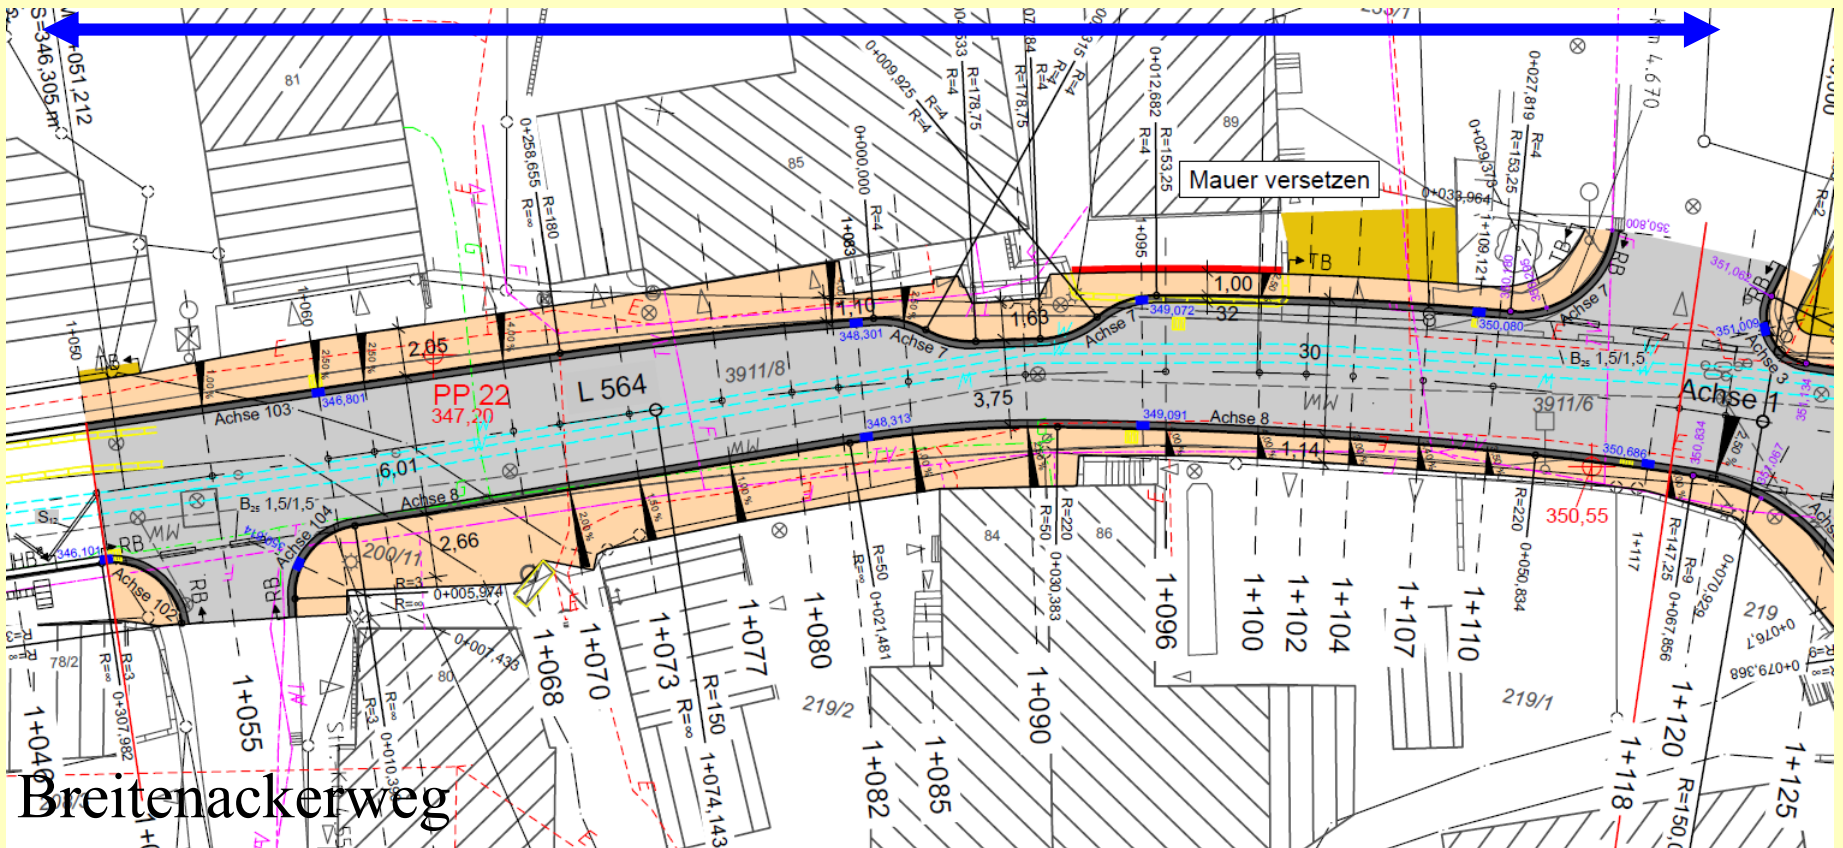

Breitenackerweg

2021

Februar

April

Juni

August

Oktober

Dezember


Februar

2022

3. Abschnitt

Aug, 21 - Nov, 21

L 564 / Obere Dorfstraße - Bereich Engstelle

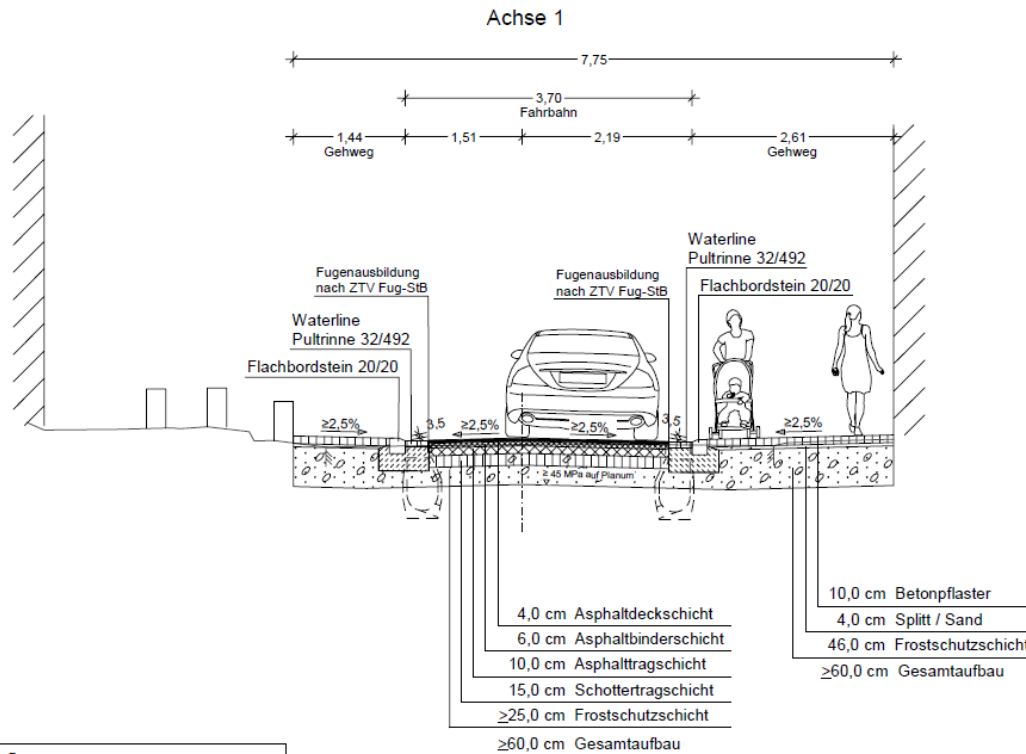

2021

Februar

April

Juni

August

Oktober

Dezember


Februar

2022

3. Abschnitt


Aug, 21 - Nov, 21

3. Bauabschnitt

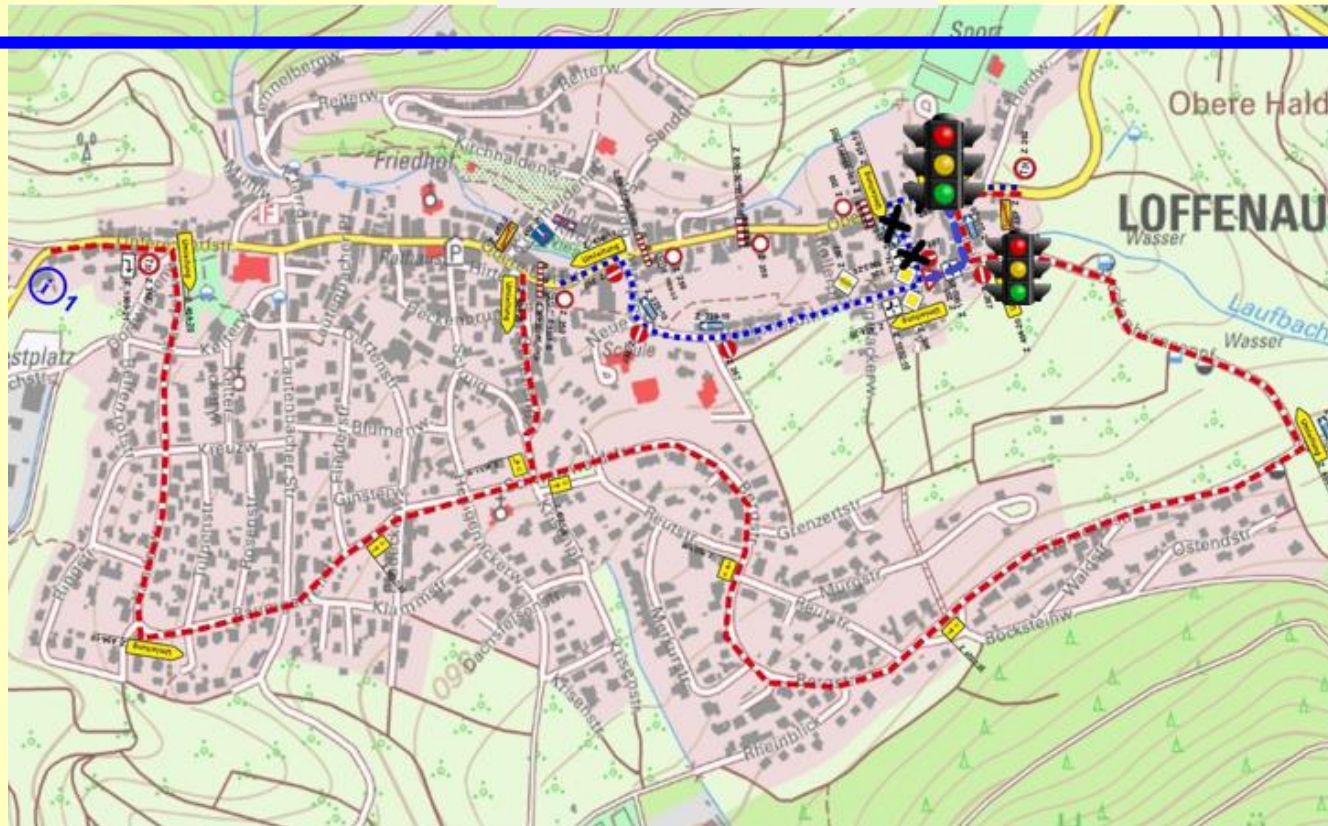

4. Abschnitt

Nov, 21 - Feb, 22

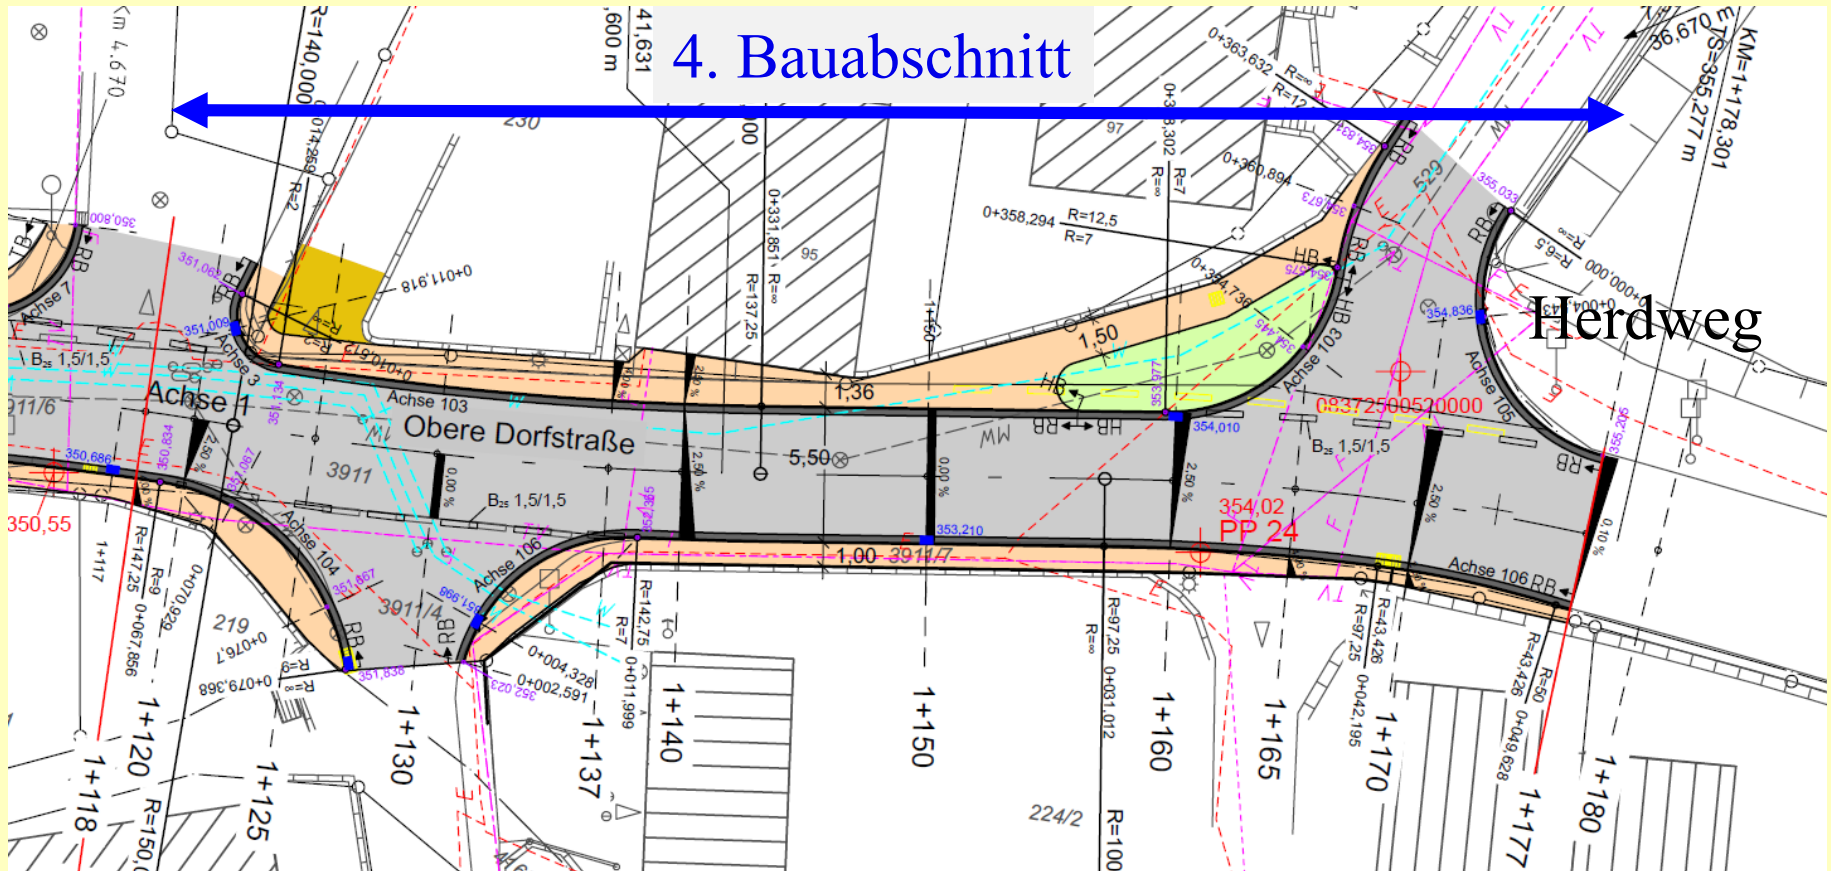

2021

Februar

April

Juni

August

Oktober


Dezember

Februar

2022

4. Abschnitt

Nov, 21 - Feb, 22

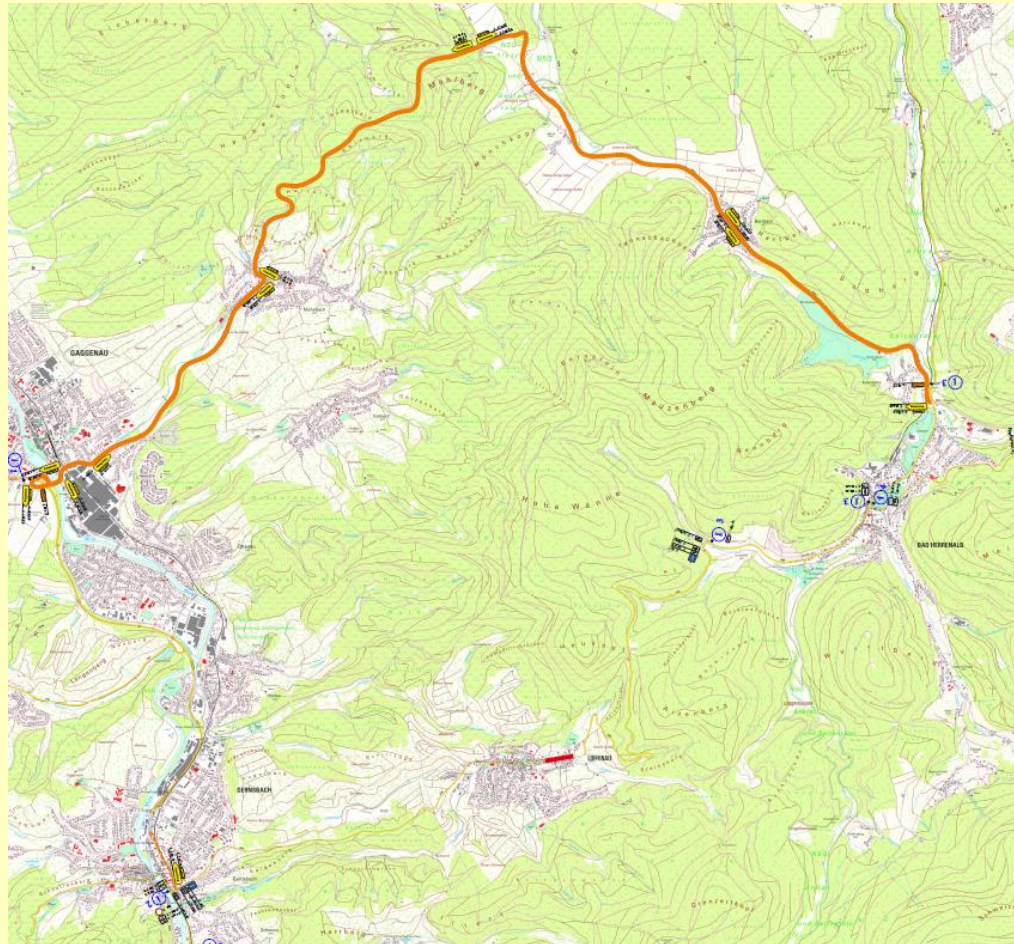

2021

Februar

April

Juni

August

Oktober

Dezember

Februar


2022

Vorarbeiten FDE

Jun, 21 - Juli, 21

FDE

4 Tage vsl. Sommerferien

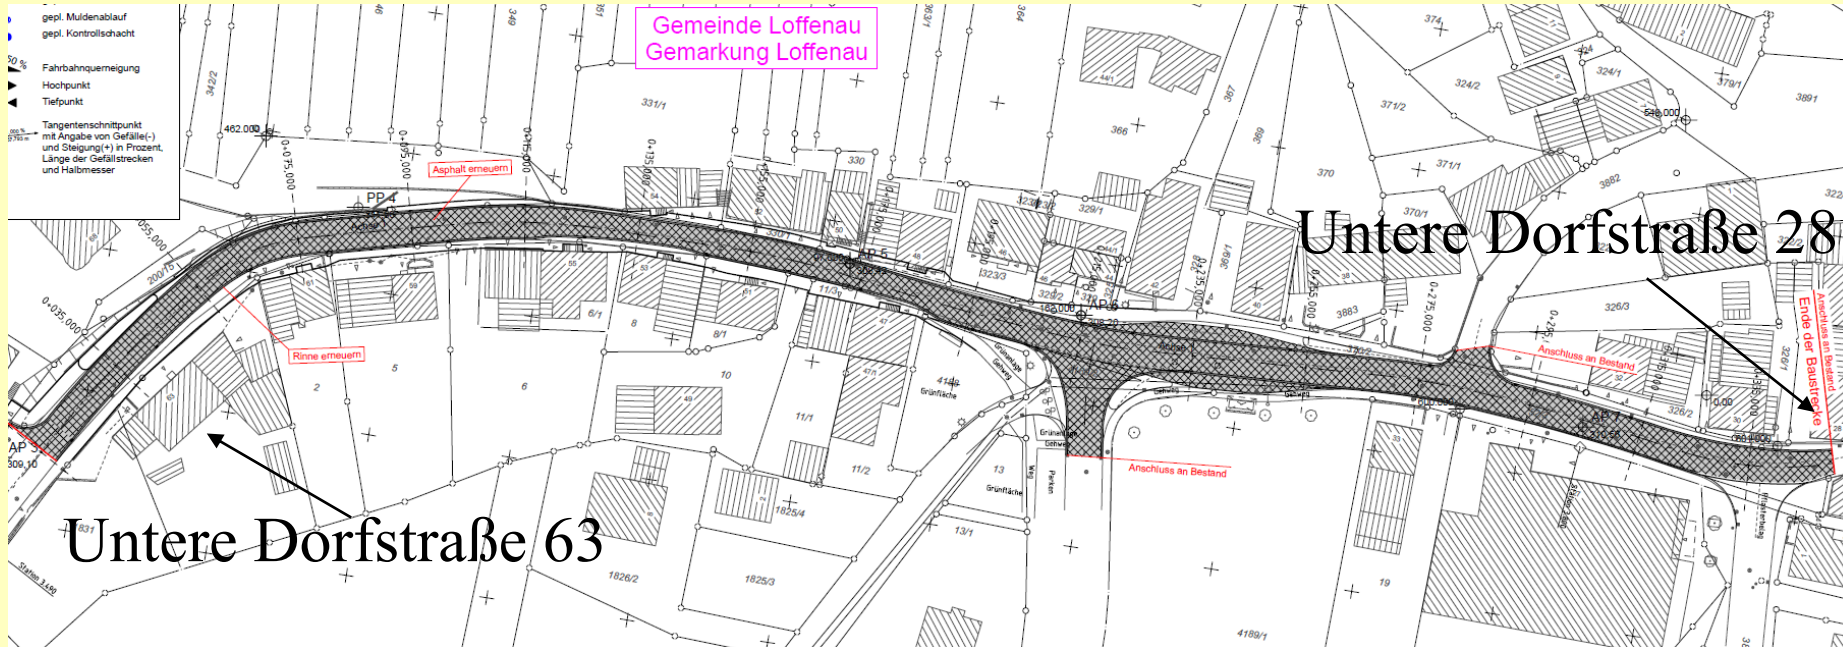

2021

Februar

April

Juni

August

Oktober

Dezember

Februar

2022

Vorarbeiten FDE


Jun, 21 - Juli, 21

FDE

4 Tage vsl. Sommerferien

L 564 / Obere Dorfstraße

Achse 1

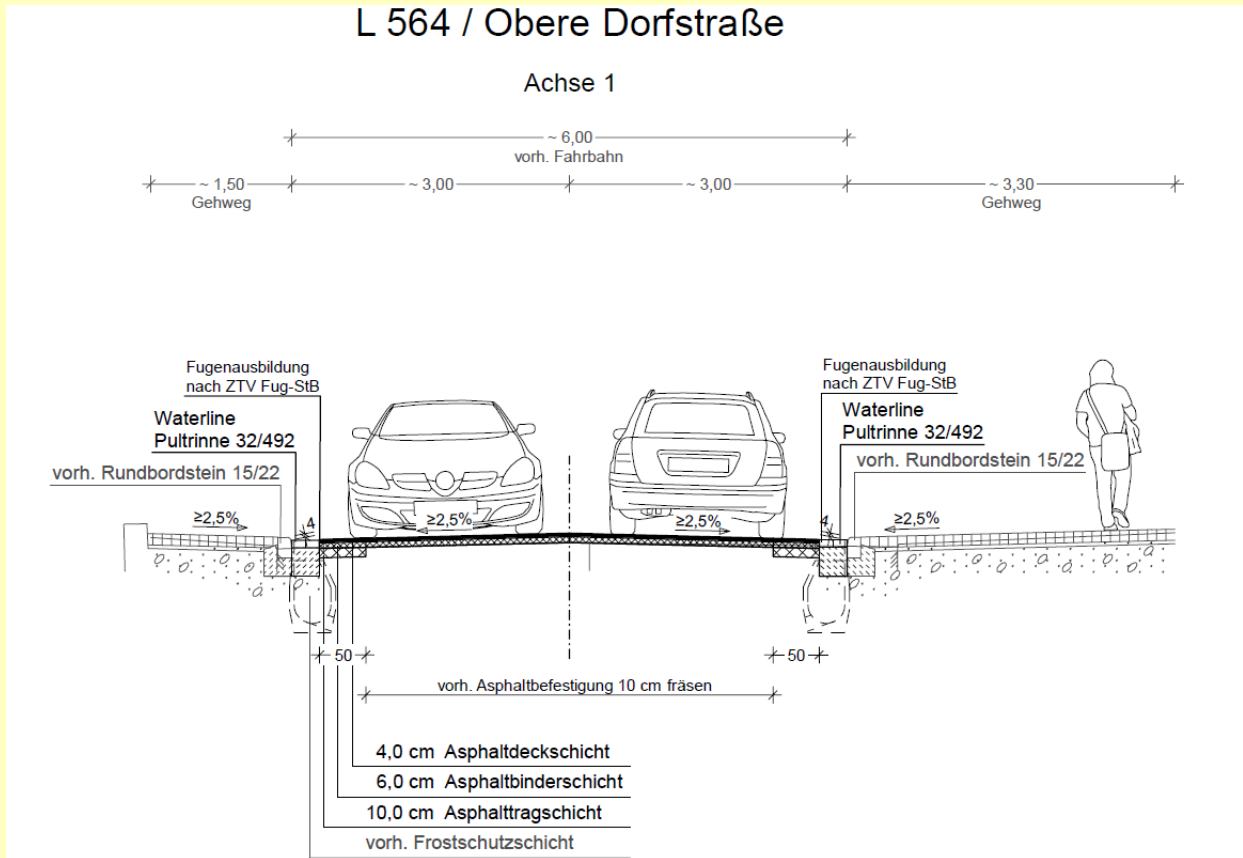

Baden-Württemberg

REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE

2021

Februar

April

Juni

August

Oktober

Dezember

Februar


2022

Vorarbeiten FDE

Jun, 21 - Juli, 21

FDE

4 Tage vsl. Sommerferien

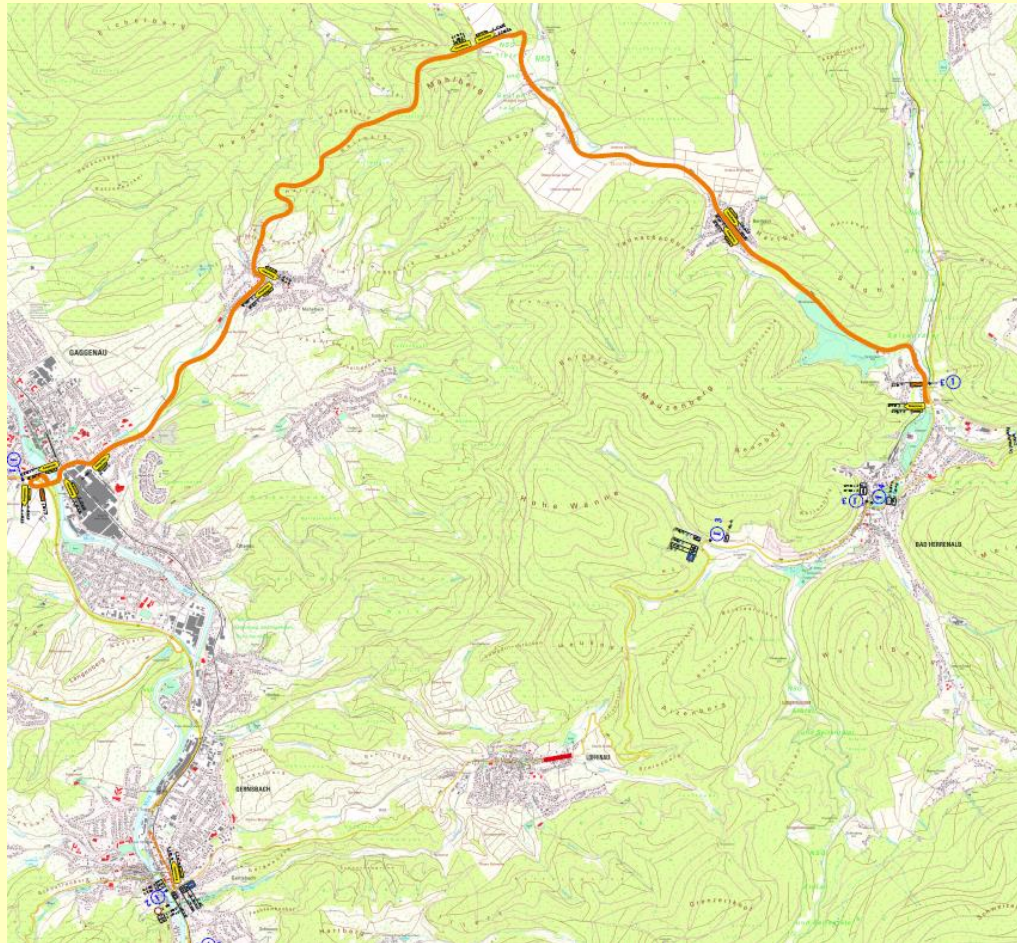

2021

Februar

April

Juni

August

Oktober

Dezember

Februar

2022

Vorbereitungen

Baubeginn 15.02.2021

1. Abschnitt

Feb, 21 - Aug, 21

2. Abschnitt

März, 21 - Sep, 21

3. Abschnitt

Aug, 21 - Nov, 21

4. Abschnitt

Nov, 21 - Feb, 22

Vorarbeiten FDE

Jun, 21 - Juli, 21

FDE

4 Tage in den Sommerferien

Asphalteinbau Abschnitt 1-4

Bauende Ende Feb 22

Vielen Dank für Ihr Interesse!

